


**eu progres** ▶▶

Program evropskog partnerstva sa opštinama

Програма за европeйско партнџорство с общините

# Пети тримесечен доклад

## 1-ви януари – 31-ви март 2012

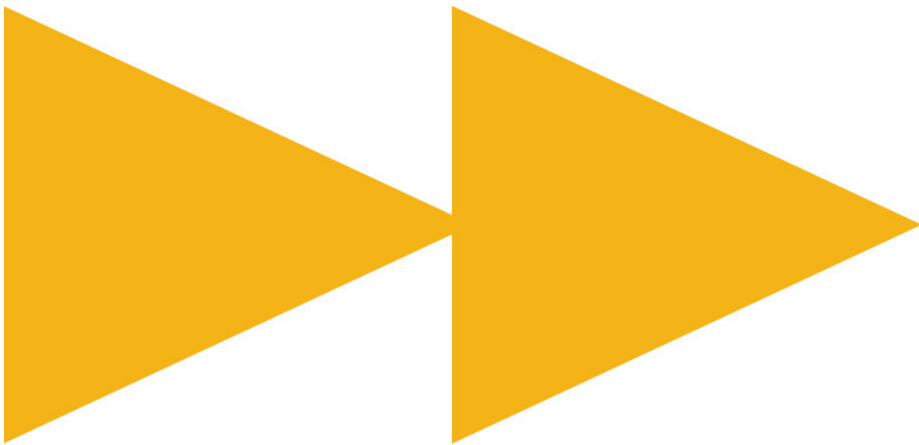

Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



 **UNOPS**

Sprovodi program



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



UNOPS

Sprovođi program

eu progres

Program evropskog partnerstva sa opštinama

## Резюме

Насрочването на парламентарните и местни избори за 6-ти май веднага предизвика промотивни активности и преговори за коалиции в цялата зона на отговорност на ЕУ ПРОГРЕС. Четири албански партии от Южна Сърбия обявиха, че ще участват в Републиканските избори, докато в Югозападната част на Сърбия продължиха спекулациите за евентуалното ангажиране на муфтията Зукорлич.

ЕУ ПРОГРЕС до сега е сключил 120 договори за безвъзмездна помощ на обща стойност от над 4,4 милиона евро. Също голямо значение има и съветодавната подкрепа, която Програмата продължава да предлага на своите партньори в Южна и Югозападна Сърбия. Някои от основните инициативи, които подкрепя Програмата включват: 40 проекти, в които партньори са граждански сдружения и местните самоуправления, 25 общински инфраструктурни проекти, два големи междуобщински инфраструктурни проекта, 23 проекта за подкрепа на развитие на плановете за регулация, развитие на техническите документи за осем приоритетни общински проекти и три проекта, свързани с предлагането на безплатна правна помощ.

Реализацията на проектите, обаче и занапред се сблъсква с редица препятствия и в момента 55 (49%) от проектите се реализират със закъснение, докато реализацията на осем проекта може да се охарактеризира като критична. ЕУ ПРОГРЕС прилага модела на индиректна реализация, което означава, че ползващите получават безвъзмездна помощ и стават „собственици“ на определени проектни активности. Този подход е по-ефикасен по отношение на изграждането на капацитетите, обаче в момента представлява и основна причина за забавянето на реализацията на проектите. Примерно, общините изпитват трудности при благовременно подsigуряване на средства за съфинансиране, при подsigуряването на средства за качествена техническа документация за одобрените инфраструктурни проекти, при провеждането на процедурите за обществени поръчки и изпълняването на договорените задължения, което има за последица отлагане на реализацията на проектите, обаче не представлява заплаха за самата реализация на по-голяма част от проектите. Покрай това реализацията на активностите беше обременена и заради острата зима, която през януари и февруари 2012 година захвана Сърбия.

ЕУ ПРОГРЕС е установил и поддържа добри отношения с Правителството на Република Сърбия, както и с развойните агенции и програми. Това партньорство се потвърждава от съвместните проекти и активности с Министерството на околната среда, мините и просторното планиране, Министерството на икономиката и регионалното развитие, Министерството за човешки и малцинствени права, Министерството за държавно управление и местно самоуправление, Канцеларията за устойчиво развитие на недостатъчно развитите региони и Кординационното тяло за Прешево, Буяножац и Медведжа. Обаче, както и по отношение на ЛСУ, средствата за съфинансирането на проектите, които подsigуряват министерствата, както и съвместната реализация на проектите, предизвикват закъснения и несигурност, което също забавя благовременното завършване на проектите.

**Програмата финансират Европейския съюз, Правителството на Швейцария и Правителството на Сърбия, а провежда я УНОПС със съдействие на 25 общини от южна и югозападна Сърбия.**



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC



UNOPS

Sprovođi program

eu progres

Program evropskog partnerstva sa opštinama

На заседанието си проведено през февруари в Лесковац Управителния съвет на Програмата (УНОП) одобри проекти на стойност от повече от половин милион евро. Става дума за проекти за регионално производство на овощия в Пчински окръг, път до обекта на бързата помощ в Блаце, регулиране на река Стражевица в Прокупле, изграждане на пазар за млечни продукти в Житораджа, изготвяне на техническа документация за товарене на отпадъци в Сйеница, както и концепт на кампанията за родова равноправност. Председателстващият на УНОП заяви, че Канцеларията за европейски интеграции в РС (СЕИО) задвижва консултации за проект, който може би ще наследи ЕУ ПРОГРЕС и помоли ЕУ ПРОГРЕС да окаже помощ в местните консултации.

Този доклад съдържа информации за развитието на събитията през първото тримесечие от 2012 година. В Глава 1 е представен преглед на целите, резултатите и ползващите на ЕУ ПРОГРЕС. В Глава 2 са представени най-новите информации за политическите, обществените и икономическите събития, докато в Глава 3 е представен подробен преглед на активностите в Програмата. Глава 4 е съсредоточена върху въпросите за управление, а Глава 5 съдържа преглед на партньорствата, за които Програмата е дала свой принос. Последната глава, Глава 6, предлага информация за прозрачността на Програмата.

В Приложенията подробно са изложени информации за някои конкретни активности, които са предприети в рамките на Програмата.

**Програмата финансират Европейския съюз, Правителството на Швейцария и Правителството на Сърбия, а провежда я УНОПС със съдействие на 25 общини от южна и югозападна Сърбия.**
